ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0064 "Szervezetfejlesztési program a Tatabányai Törvényszéken"
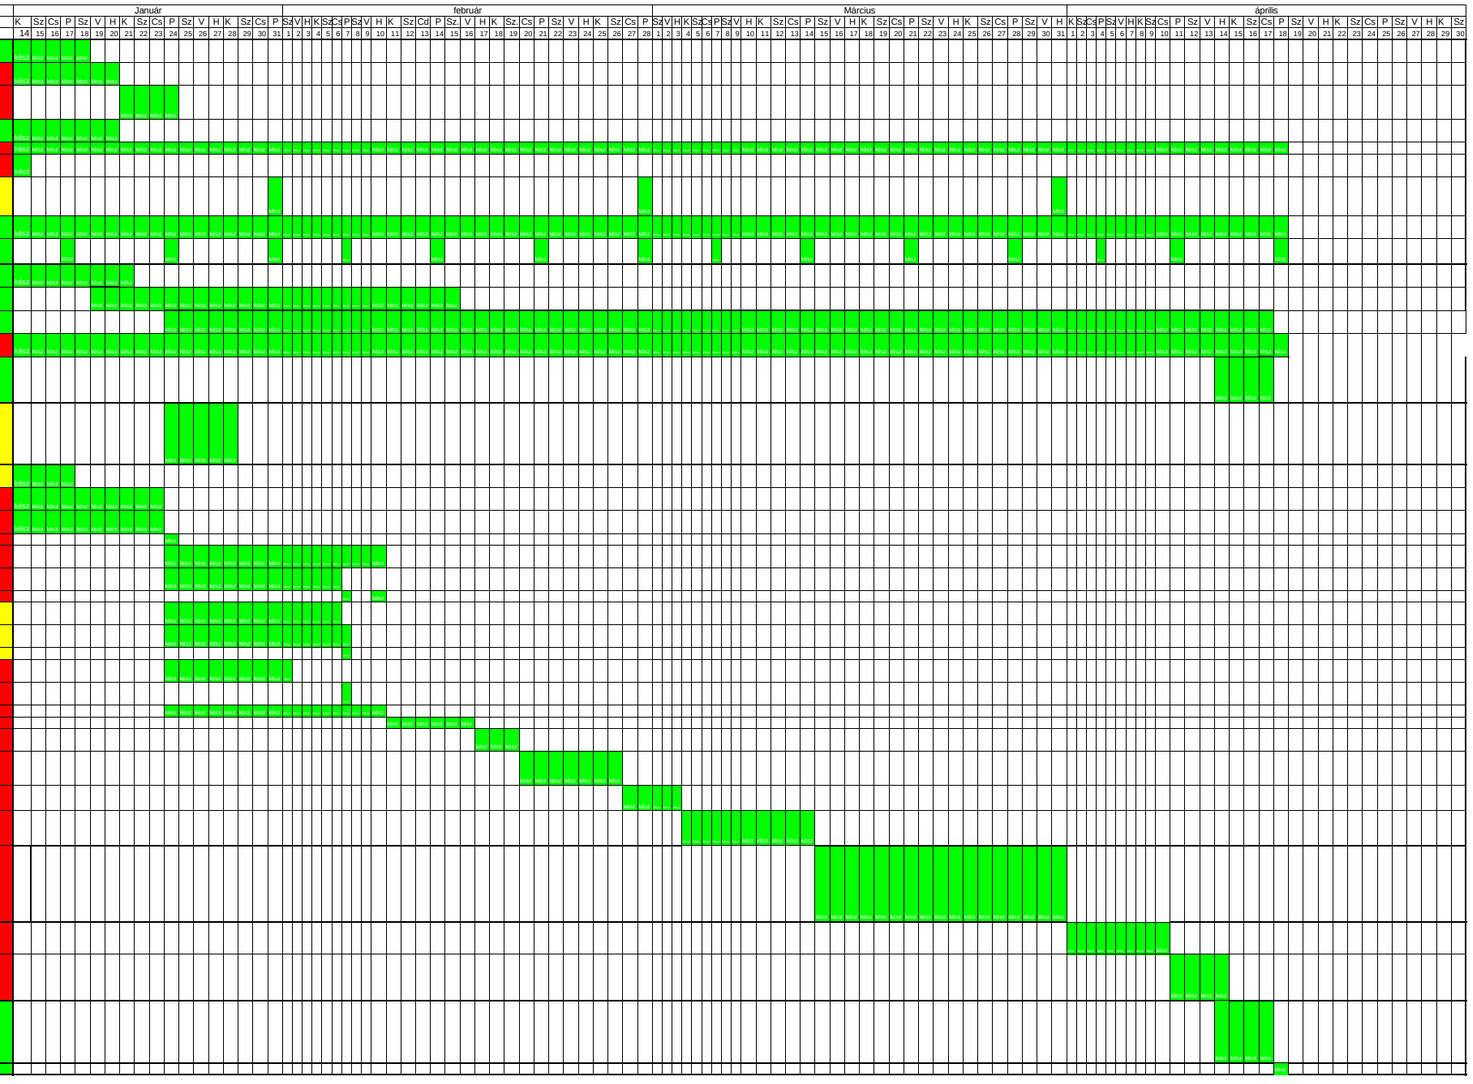
| | feladatok | Felelős | Megjegyzés | Tervezett határidő kezdete | Tervezett határidő vége | Készültség | Fontosság |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Önértékelés szervezőinek és tervezőinek előkészítése | Munkacsoport tagok kijelölése (munkacsoport vezető és koordinátor) | dr. Csorba Zsolt Odön | | 2014.01.13 | 2014.01.18 | kész | közepes |
| | Feladatlista összeállítása és ütemterv készítése | Munkacsoport vezetője | | 2014.01.14 | 2014.01.20 | kész | magas |
| | Feladatok elosztása, felelősök kijelölése a munkacsoporton belül kiadása | Munkacsoport vezetője | véglegesítésre a 2014. 01.24-i értekezleten kerül | 2014.01.21 | 2014.01.24 | kész | magas |
| | Projekt beszámoltatási rendszer kidolgozása | Munkacsoport vezetője | | 2014.01.14 | 2014.01.20 | kész | közepes |
| | Projekt koordinálás | Munkacsoport vezetője | | 2014.01.14 | 2014.04.30 | kész | magas |
| | Munkacsoport ülések időpontjának meghatározása | Munkacsoport vezetője | | 2014.01.14 | 2014.01.14 | kész | magas |
| | Beszámolás a törvényszék felső vezetése felé a munkacsoport tevékenységéről | Munkacsoport vezetője | | minden hónap utolsó munkanapja | | kész | alacsony |
| | Dokumentumok előírásoknak való megfelelésének ellenőrzése | Varga Katalin | | folyamatosan | | kész | közepes |
| | Munkacsoport ülések | Munkacsoport vezetője | | minden péntek 9.30 óra | | kész | közepes |
| Önértékelési projekt kommunikációja | Munkacsoport kommunikációs terv elkészítése | dr. Balogh Márta | | 2014.01.14 | 2014.01.21 | kész | közepes |
| | Kommunikációs terv szerinti előzetes tájékoztatás a munkatársak részére | dr. Balogh Márta | | 2014.01.19 | 2014.02.15 | kész | közepes |
| | Önértékelést végző munkatársakkal történő kapcsolattartás | dr. Balogh Márta | | 2014.01.24 | projektzárásig | kész | közepes |
| | Munkacsoporton belüli kommunikáció | munkacsoport minden tagja | | 2014.01.14 | projektzárásig | kész | magas |
| | Kommunikációs terv szerinti projektzáráskor tájékoztatás (ugyanaz mint a Szervezetszintű tájékoztatás az intézkedési tervekről) | dr. Balogh Márta | | 2014.04.17 | 2014.04.17 | kész | közepes |
| Önértékelési csoport létrehozása | Önértékelési csoport tagjainak kijelölése | Munkacsoport vezetője | | 2014.01.24 | 2014.01.24 | kész | alacsony |
| Képzések szervezése | Képzési anyagok előzetes eljuttatása a projekttagok részére | Munkacsoport vezetője | | 2014.01.14 | 2014.01.17 | kész | alacsony |
| | Munkacsoport tagjainak képzési anyag összeállítása | Munkacsoport vezetője | | 2014.01.14 | 2014.01.23 | kész | magas |
| | Munkacsoport tagok képzésére felkészülés | Munkacsoport vezetője | | 2014.01.14 | 2014.01.23 | kész | magas |
| | Munkacsoport tagok képzése | Munkacsoport vezetője | | 2014.01.24 | 2014.01.24 | kész | magas |
| | Képzés szervezése az önértékelési csoport részére | Szintainé | | 2014.01.24 | 2014.02.10 | kész | magas |
| | Képzési anyag összeállítása az önértékelési csoport részére | dr. Hevesi Zoltán | | 2014.01.24 | 2014.02.06 | kész | magas |
| | Önértékelési csoport képzése | dr. Hevesi Zoltán | | 2014.02.07 | 2014.02.10 | kész | magas |
| | Képzési anyag összeállítása a törvényszék vezetése részére | dr. Band Ferenc | | 2014.01.24 | 2014.02.06 | kész | alacsony |
| | Törvényszék vezetők képzésének megszervezése | Szintainé | | 2014.01.24 | 2014.03.15 | kész | alacsony |
| | Törvényszéki vezetők képzése | dr. Band Ferenc | | 2014.02.07 | 2014.03.15 | kész | alacsony |
| Önértékelés megkezdése | Belépési kódok igénylése az értékelők részére | Varga Katalin | | 2014.01.24 | 2014.02.01 | kész | magas |
| | Belépési kódok kiosztása az értékelők részére | Varga Katalin | | 2014.02.07 | 2014.02.07 | kész | magas |
| | "Bizonyítékok" összegyűjtése | Munkacsoport vezetője | | 2014.01.24 | 2014.02.28 | kész | magas |
| | Teszt értékelés a rendszerben | Értékelő csoportok | | 2014.02.11 | 2014.02.16 | kész | magas |
| | **Egyéni értékelésének elkészítése az on-line rendszerben** | **Munkacsoport vezetője** | | 2014.02.07 | 2014.02.24 | **kész** | **magas** |
| | Egyéni eredmények összegzése, előkészítése a konszenzus megbeszéléshez | Munkacsoport vezetője | | 2014.02.24 | 2014.02.27 | kész | magas |
| | Konszenzus teremtése az önértékelési csoportban | Munkacsoport vezetője | | 2014.03.03 | 2014.03.05 | kész | magas |
| | Kulcsfolyamatok, szolgáltatások, érdekeltek, tevékenységek meghatározása | Munkacsoport vezetője | | 2014.03.05 | 2014.03.14 | kész | magas |
| Önértékelés eredményeit bemutató jelentés elkészítése | Önértékelés eredményeit összegző vezetői jelentés összeállítása | Munkacsoport vezetője | | 2014.03.15 | 2014.03.31 | kész | magas |
| Intézkedési terv összeállítása | Intézkedési tervek összeállítása, fejlesztendő területek rangsorolása | dr. Band Ferenc | | 2014.04.01 | 2014.04.10 | kész | magas |
| | Intézkedési tervek ütemezése | dr. Band Ferenc | | 2014.04.11 | 2014.04.14 | kész | magas |
| Intézkedési terv kommunikációja a | Szervezetszintű tájékoztatás az intézkedési tervekről | dr. Balogh Márta | | 2014.04.14 | 2014.04.17 | kész | közepes |
| Projekt zárása | Projektzáró értekezlet | Munkacsoport vezetője | | 2014.04.18 | 2014.04.18 | kész | közepes |
